

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 68,68% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

- CS PLETERNICA 4- postavljanje izolacije objekta

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,02% tlačnog voda i 83,10% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 279 okana kućnih priključaka (70,63%).

- KUZMICA- postavljanje gravitacijskog kolektora

- RB+CS DERVIŠAGA 1- u tijeku armirano-betonski radovi

- DERVIŠAGA- izrada armirano betonskog okna PO1

- BLACKO- postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 90,88% tlačnog voda i 90,26% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,85% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,96% gravitacijskog i 76,35% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 99,06% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 86,48% gravitacijskog i 92,21% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,57% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.379,59 m (87,27%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1075 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

Slika 1: Blacko

Slika 2: Kuzmica

Slika 3: RB+CS Dervišaga 1

Slika 4: CS Pleternica 4





Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 68,68% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,02% tlačnog voda i 84,13% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).

- KUZMICA- izrada armirano-betonskog okna

- BLACKO- postavljanje gravitacijskog kolektora

- RB+CS DERVIŠAGA 1- u tijeku armirano-betonski radovi, betoniranje zidova

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 99,88% tlačnog voda i 91,34% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,85% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,96% gravitacijskog i 76,35% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 99,06% tlačnog voda

- VIŠKOVCI –postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 86,48% gravitacijskog i 92,21% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,57% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.


Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.514,79 m (87,55%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

Slika 1: Viškovci

Slika 2: Blacko

Slika 3: Dervišaga 1

Slika 4: Kuzmica

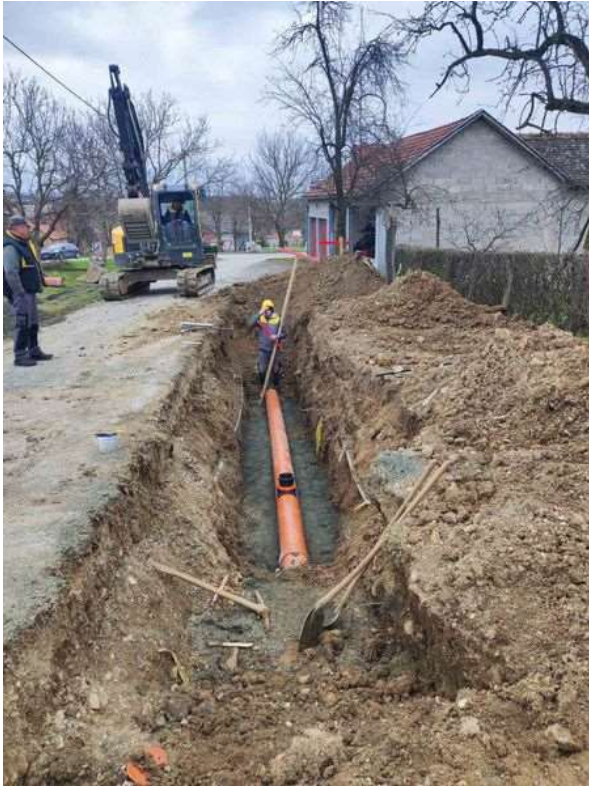



3. travnja 2023.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 83,82% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).

- RB+CS DERVIŠAGA 1- u tijeku postavljanje izolacije objekta

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 100% tlačnog voda i 89,04% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

- JAKŠIĆ- postavljanje gravitacijskog kolektora
- izrada armirano-betonskog okna

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda

- VIŠKOVCİ –postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 95,44% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.665,86 m (87,86%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

11. travnja 2023.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 84,57% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).

- RB+CS DERVIŠAGA 1- u tijeku postavljanje izolacije objekta

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 100% tlačnog voda i 90,35% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda

- VIŠKOVCİ –postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 95,44% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

- FRKLJEVCİ- postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.775,36 m (88,09%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

21. travnja 2023.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 84,63% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 100% tlačnog voda i 90,35% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

- JAKŠIĆ- postavljanje gravitacijskog kolektora
- izrada armirano-betonskog okna

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 98,86% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

- FRKLJEVCI- postavljanje gravitacijskog kolektora
- ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.665,86 m (88,32%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

5. svibnja 2023.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 84,63% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 100% tlačnog voda i 90,35% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda
- BLACKO - postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 100% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

- FRKLJEVCI- postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.924,46 m (88,39%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

15. svibnja 2023.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 84,98% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 100% tlačnog voda i 90,35% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda
- BLACKO - postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 100% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.963,26 m (88,47%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

26. svibnja 2023.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 65,32% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 78,06% tlačnog voda i 85,47% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 287 okana kućnih priključaka (72,66%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 100% tlačnog voda i 90,35% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,88% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,99% gravitacijskog i 77,37% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda
- BLACKO - postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 100% gravitacijskog i 92,71% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,17% gravitacijskog i 78,58% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 43.017,36 m (88,59%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1083 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

24. lipnja 2023.

Radovi na projektu aglomeracije Pleternica odvijaju se nesmetano i po planu

Stanje radova na projektu:

JAKŠIĆ-KP Jakšić 2- betoniranje gornje ploče kišnog preljeva

4. kolovoza 2023.

Stanje radova na projektu aglomeracije Pleternica

UPOV Pleternica: Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica izvode se prema planu. Trenutno se vrši iskop za tzv. SBR bazen. Izgrađeni su pristupni put i cesta.

MREŽA Pleternica: Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Aglomeracije Pleternica se gotovo ne izvode osim manjih sanacija. Intenzitet radova je smanjen na minimum..

25. kolovoza 2023.

Stanje radova na projektu aglomeracije Aglomeracija Pleternica

UPOV Pleternica: Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica izvode se prema planu. Trenutno se vrši iskop za tzv. SBR bazen. Izgrađeni su pristupni put i cesta.

MREŽA Pleternica: Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Aglomeracije Pleternica se gotovo ne izvode osim manjih sanacija. Intenzitet radova je smanjen na minimum.
